

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA BLOCO IV

LOCAL: Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitário, Rio Verde-GO

I. OBJETIVO

O objetivo deste é especificar explicar como os trabalhos deverão ser seguidos na Reforma do Bloco IV na UniRV - Rio Verde-GO.

II. DISPOSIÇÕES


O edifício a ser reformado não poderá ser desocupado pelos alunos e professores, por isso é necessário um plano de execução para não atrapalhar o andamento da obra e nem das aulas.

Foi previsto um prazo maior de execução dos trabalhos, evitando problema quanto ao prazo contratual.

A obra será dividida em 4 etapas, cada etapa só será iniciada se a etapa anterior estiver concluída.

A área a ser trabalhada em cada etapa deverá ser devidamente demarcada e interditada com sinalização e fitas, para evitar acidentes e maiores transtornos.

Segue planta baixa das áreas e sequencia das etapas:

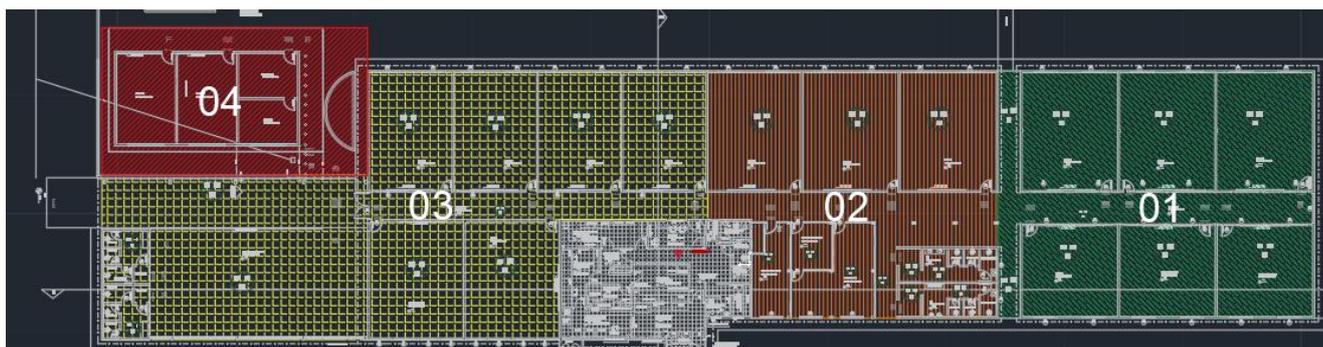

Etapa 01 – Salas 08 a 11, 2 salas de laboratórios e respectivas circulações;

Etapa 02 – Salas 05 a 07, Diretoria, Banheiros e respectivas circulações;

Etapa 03 – Salas de 01 a 04, sala 12, Laboratório de Odontologia, Pátio Coberto com banheiros e respectivas circulações;

Etapa 04 – Ampliação para Mestrado;

Etapa 05 – Área externa;
